



**Captação de Recursos Fundo
a Fundo da Reconstrução
Sistema de Proteção Contra
as Cheias**



**PREFEITURA DE
CANOAS**



**Secretaria Municipal de Projetos e Captação
de Recursos e Parceria Público-Privada**

Secretária Daniela Fontoura
Secretária Adjunta Arq. e Urb. Jerusa Mattos
Secretário Adjunto Eng. Maurício da Rocha
Engenheiro: Tiago Ortiz


Secretário Municipal de Obras e Reconstrução

Secretário Eng. Victor Hampel
Engenheiros: Marco Oliveira
Renata Cardoso
Herinton Filgueiras
Deivide Winter
Fernando Adornes

1. Após a enchente de maio/2024 a equipe técnica realizou os estudos e anteprojetos para as intervenções necessárias no sistema de proteção;
2. Premissa dos anteprojetos: reestabelecimento das cotas de coroamento dos dique projetados pelo DNOS, entre 6,5 e 7,0 metros.
3. Projeto executivo de dique Araçá elaborado em 2011, atualizado em 2019 e 2024 para licitação;
4. Cota de cheia de em Porto Alegre:
1941 - 4,75m
2024 – 5,37m
5. Se os diques estivessem na cota original de projeto, não haveria o transbordamento em maio/2024.


OS DIQUES

- Em Canoas o DNOS estabeleceu uma cota de coroamento dos diques entre **+6,50 a +7,00 metros**. Com essas cotas a probabilidade de ocorrência de uma inundação semelhante a de 1941 corresponde a um período de retorno(ou tempo de recorrência) de 370 anos.

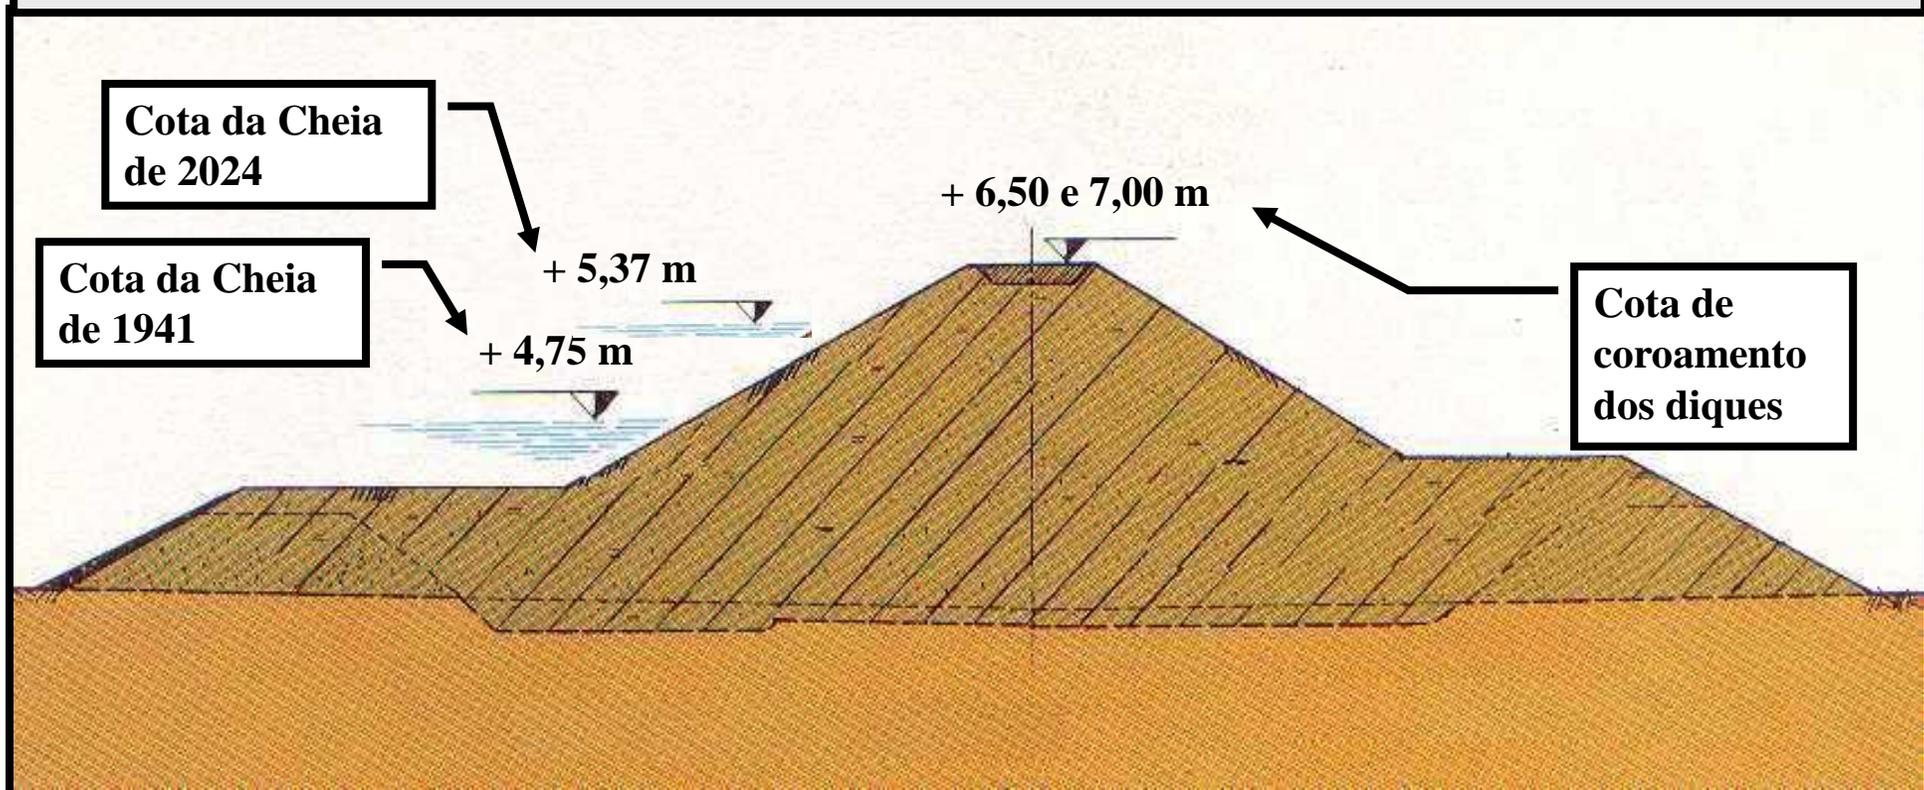

PROJETOS E OBRAS CADASTRADAS NO ESTADO

Item	Tipo de estrutura	Identificação da estrutura	Finalidade da utilização do fundo	Status da contratação	Descrição do Status	Prazo de execução (meses)	Valor estimado ou valor do contrato (R\$)	Execução de Obras
1	Casa de bombas	Modernização das Casas de Bombas	Projeto e obra	Concluído		30	R\$ 105.000.000,00	Não iniciado
2	Dique	Rua Gravataí – Trecho 2	Projeto e obra	Concluído	8,00%	12	R\$ 11.855.575,07	em andamento
3	Dique	Rua Gravataí – Trecho 3	Projeto	Em andamento		6	R\$ 667.051,55	Não iniciado
4	Dique	Rua Gravataí – Trecho 3	Obra	Aguarda Projeto		18	R\$ 23.788.735,08	Não iniciado
5	Muro	Muro da Cassol - Trecho 1	Obra	Concluído	7,00%	8	R\$ 1.089.000,00	em andamento
6	Dique	Dique Rio Branco – Trecho 2 - entre a Avenida Guilherme Schell e Rua Henrique Dias	Projeto e obra	Concluído		20	R\$ 50.465.433,28	não iniciado
7	Dique	Dique Rio Branco – Trecho 3 - entre a Rua Henrique Dias e Rua André Nichele	Projeto e obra	Concluído	7,00%	20	R\$ 32.644.500,00	em andamento
8	Dique	Dique Araçá	Obra	Concluído	18,94%	24	R\$ 45.150.000,00	em andamento
9	Casa de bombas	CB 9 e 10	Projeto e obra	Concluído		26	R\$ 75.000.000,00	Não iniciado
10	Dique	Fechamento da Bianchini - Elevada contenção acesso Bianchini	Projeto e obra	Contratação do projeto executivo.		24	R\$ 40.000.000,00	Não iniciado
11	Dique	Dique Mathias- fechamento definitivo	Projeto e obra	Concluído	30,90%	14	R\$ 68.500.000,00	em andamento
12	Hidrojateamento das Redes	sistema de microdregem	execução de serviços corretivos	Concluído		12	R\$ 51.666.609,42	Não iniciado
							VALOR ESTIMADO TOTAL: R\$ 505.826.904,40	

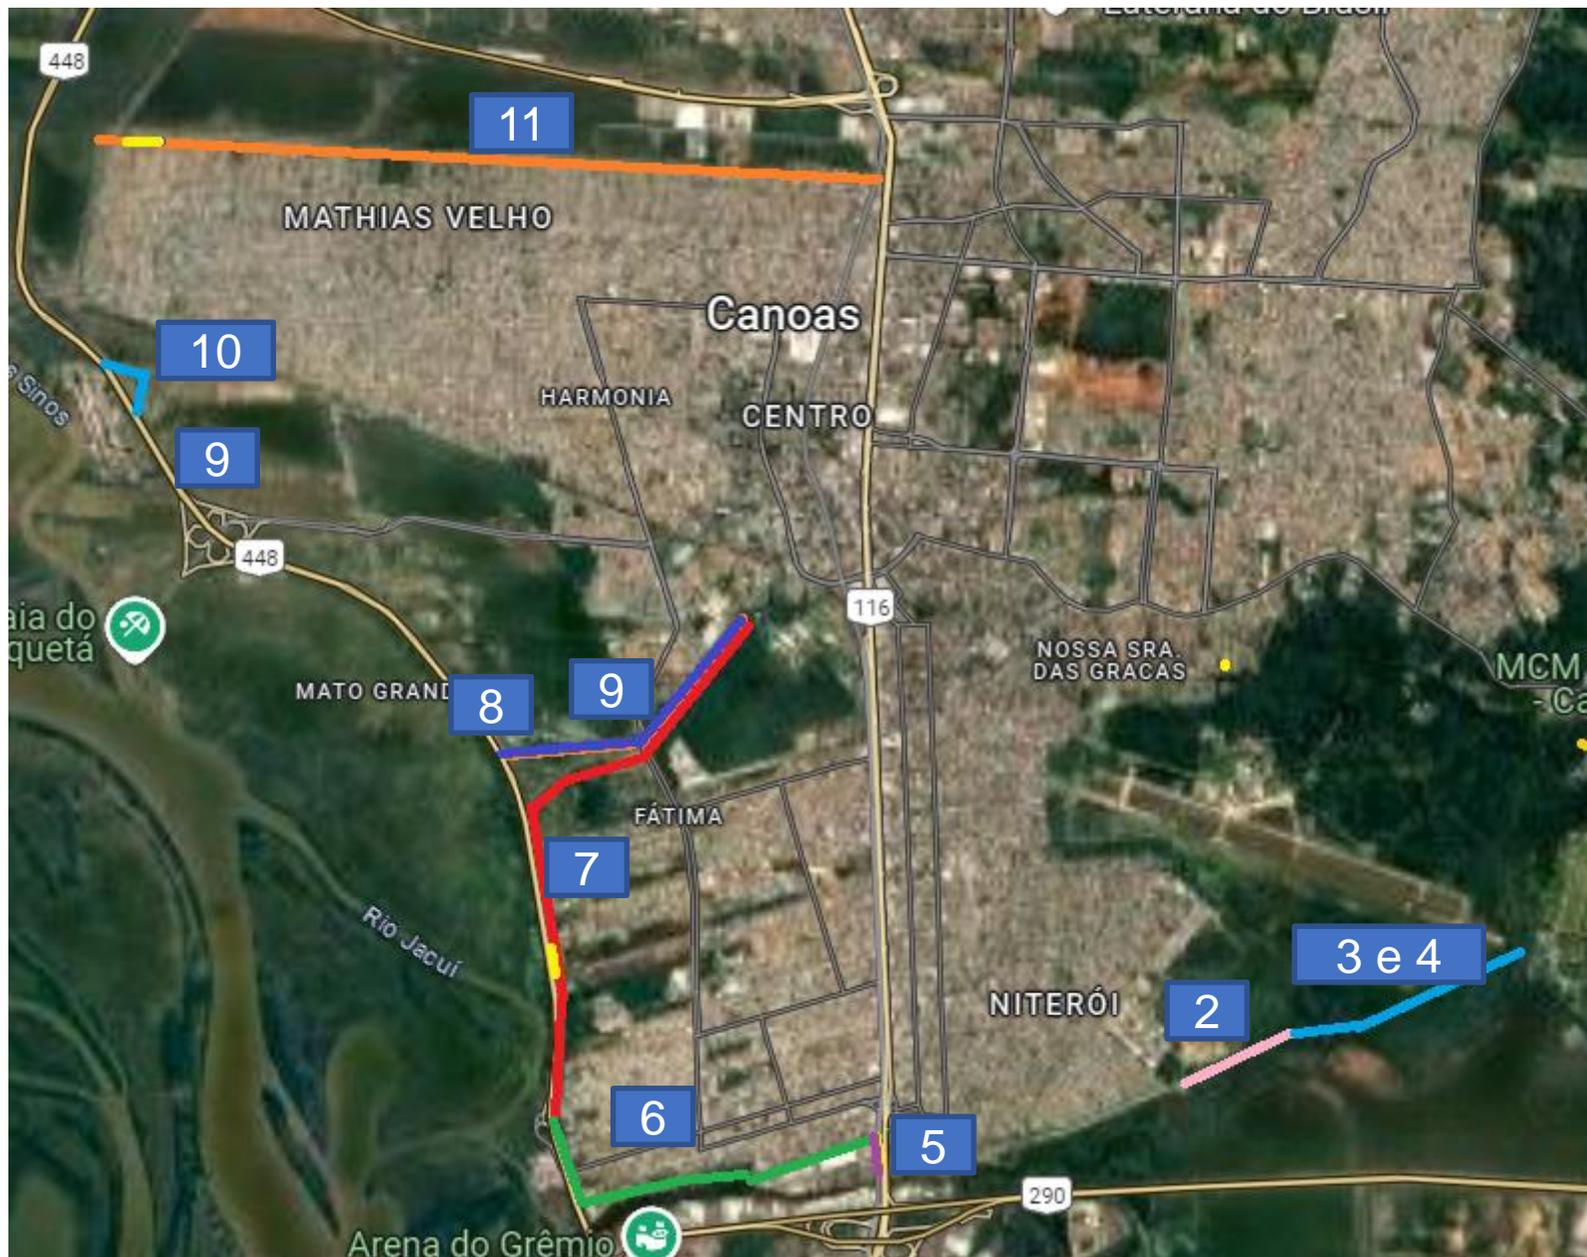

Item	Identificação da estrutura
1	Modernização das Casas de Bombas
2	Rua Gravataí – Trecho 2
3	Rua Gravataí – Trecho 3
4	Rua Gravataí – Trecho 3
5	Muro da Cassol - Trecho 1
6	Dique Rio Branco – Trecho 2 - entre a Avenida Guilherme Schell e Rua Henrique Dias
7	Dique Rio Branco – Trecho 3 - entre a Rua Henrique Dias e Rua André Nichele
8	Dique Araçá
9	CB 9 e 10
10	Fechamento da Bianchini - Elevada contenção acesso Bianchini
11	Dique Mathias- fechamento definitivo
12	sistema de microdregem

OBRAS EM EXECUÇÃO

- **DIQUE DO PÔLDER MATHIAS**
- **DIQUE PÔLDER NITERÓI FASE II**
- **MURO DA CASSOL**
- **DIQUE DO PÔLDER M. GRANDE**
- **DIQUE DO PÔLDER RIO BRANCO
FASE III**

MATHIAS VELHO

- **Empresa Eurovia**
- **CT 196/2024**
- **OIS 12/09/2024**
- **Prazo: 12 meses**
- **Custo: R\$ 68.500.000,00**

MATHIAS VELHO - STATUS

- **Executada a limpeza e decapagem**
- **Obra em andamento**
- **Valor Medido R\$ 21.165.020,71**
- **Status da Obra 30,90%**

MATHIAS VELHO







14:19 | 05/03/2025
qua.

R. Curitiba, 4015 - Mathias Velho,
Canoas - RS, 92330-310

Timemark
Foto 100% Real

MATHIAS VELHO



MATHIAS VELHO



RIO BRANCO

MURO DE CONTENÇÃO CASSOL

RIO BRANCO - STATUS MURO DE CONTENÇÃO

- **Empresa Aahbrant**
- **CT 218/2024**
- **OIS 04/10/2024**
- **vigência: 8 meses**
- **Custo: R\$ 1.089.000,00**
- **Medido: 7,00%**

RIO BRANCO - STATUS MURO DE CONTENÇÃO

- **ORS para 17/03/2025**
- **obra em andamento**
- **Etapa de fundações**
- **Sexta-feira iniciam as estacas**



10:08

29/04/2025


Ter

Av. Guilherme Schell, 420 - Rio Branco,
Canoas - RS, 92200-148

Timemark
Foto 100% Real

© NHRK4Y6N5KXXX9G Timemark Verified



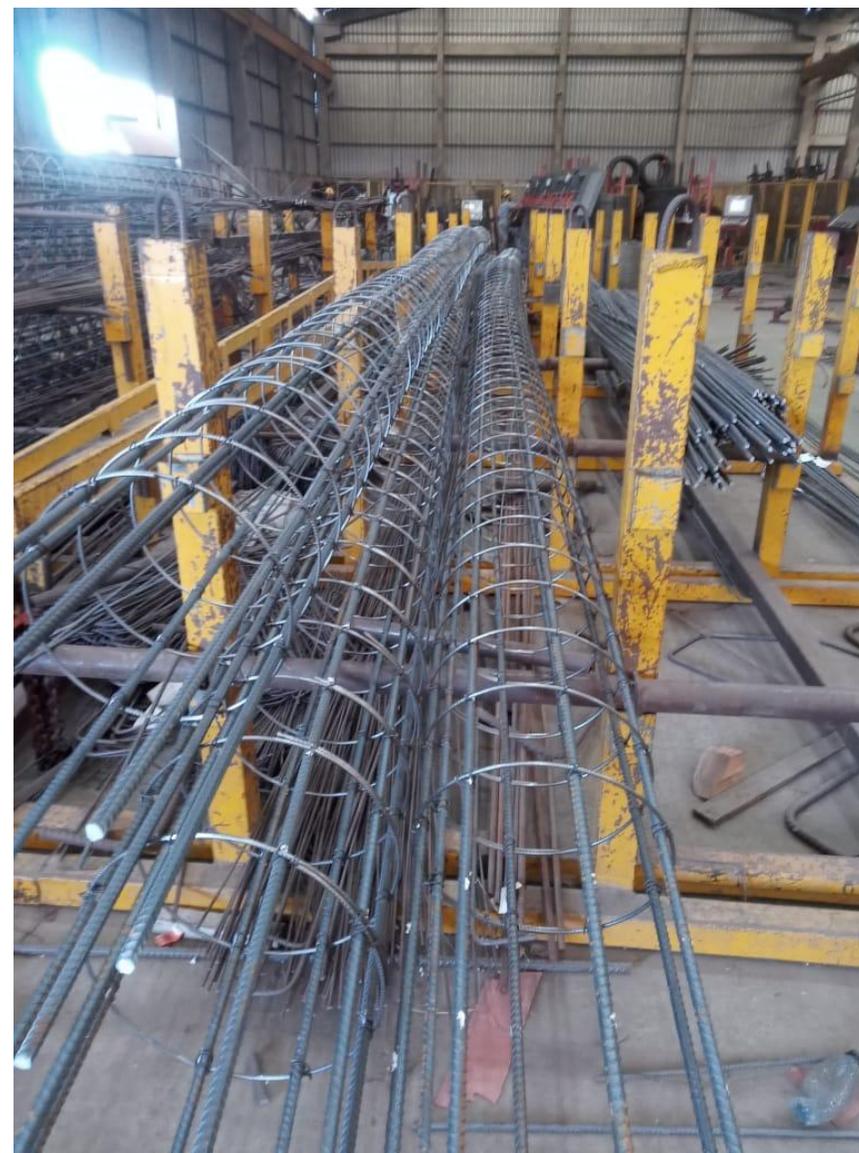

RIO BRANCO TRECHO 3a

- **Empresa Aahbrant**
- **CT 304/2024**
- **OIS 18/11/2024**
- **Vigência: 18 meses**
- **Custo: R\$ 32.644.500,00**
- **Medido: 7,00%**



DIQUE NITERÓI

- **Empresa Eurovia**
- **CT 356/2022**
- **OIS 14/12/2022**
- **vigência: 09/11/2025**
- **Custo: R\$ 29.577.633,41**
- **Medido: R\$ 24.783.979,04**
- **Avanço 83,79%**



DIQUE ARAÇÁ

- **CONTRATO 199/2024**
- **EMPRESA CONSTRUSINOS**
- **VALOR: R\$45.150.000,00**
- **PRAZO: 18 MESES**
- **ORDEN DE INÍCIO: 23/09/2024**
- **MEDIDO: R\$ 8.530.803,45 18,89%**









SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA AS CHEIAS

MAIO/2024

- Enchente
- Monitoramento diques
- Rompimento

JUN/2024

- Projeto conserto rupturas
- Licitação
- Execução Emergencial
- Recurso CORSAN

SET-OUT/2024

- Projeto Reconstituição cotas DNOS
- Licitação
- Recurso CORSAN

NOV-DEZ/2024

- RDCI Execução
- Recurso CORSAN

JAN-MAR/2025

- Captação Recursos Fundo a Fundo
- Reuniões semanais SERG
- Alinhamento Técnico PMC e SERG
- Lei nº6.801- 28/MAR - Instituiu o FMRRC

ABR/2025

- Preparação Documentos Habilitatórios
- Alinhamento Técnico
- Decreto Estadual nº58.119 Abr/2025 FUNRIGS

MAIO/2025

- Resolução Estadual nº9/2025
- Decreto Municipal nº121-Mai/2025
- Envio dos Documentos Habilitatórios
- Validação Técnica: Documentos Habilitatórios/CCARC/PRG

JUN/2025

- Validação do Comitê Gestor Plano Rio Grande
- Publicação da Resolução
- Expectativa Repasse Recurso - Integral ou Faseado

FUNRIGS – DECRETO Nº 57.647 DE 3 DE JUNHO DE 2024 - RESOLUÇÃO Nº 09/2025

✓ **Objetos do repasse:**

Projetos de restabelecimento e recuperação de sistemas de proteção e contenção de cheias pré-existentes, diretamente relacionados aos eventos de maio de 2024.

✓ **Requisitos:**

- Fundo Municipal de Reconstrução;
- Conselho Gestor;
- CNPJ específico;
- Conta corrente específica;
- Declaração - Manifestação de Interesse;
- Formulário específico dos objetos da demanda;
- Planilha Cadastramento de Demandas;
- Declaração da ausência de sobreposição dos recursos;
- Requisitos e critérios complementares estabelecidos pelo Comitê Gestor do Plano Rio Grande;
- Apresentar nexos causais com eventos de maio de 2024 - Relatórios Técnicos complementares.

Avaliação técnica:

Será realizada por **comissão** composta por representantes da **Secretaria da Reconstrução Gaúcha** e de **Secretarias Finalísticas** convidadas a participar, observando **critérios técnicos e operacionais** necessários à destinação dos recursos.

Execução do objeto:

Todas as etapas de responsabilidade do município, inclusive as previstas em normas técnicas e legais.

Prestação de contas:

60 dias após conclusão do objeto.

Fonte: <https://planoriogrande.rs.gov.br/fundo-a-fundo-reconstrucao>

Novo Pôlder São Luis:

Execução via FIRECE - Fundo de Apoio à Infraestrutura para Recuperação e Adaptação a Eventos Climáticos Extremos.

OBRIGADO!



PREFEITURA DE
CANOAS
